

PREHL'AD HARMONOGRAMU


Vybudovanie športovo oddychovej zóny v obci Skároš

Variant: realizácia v 12 týždňoch

Objednávateľ:	Obec Skároš
Zhotoviteľ:	PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice
Projektant:	Ing. Radoslav Cigan, ProCer Košice, s.r.o.
Celkové trvanie:	12 týždňov (cca 2.8 mesiaca)
Náklady bez DPH:	156 513,90 €
DPH 23 %:	35 998,20 €
Náklady s DPH:	192 512,10 €

ČERPANIE NÁKLADOV PODĽA TÝŽDŇOV [€ bez DPH]

Činnosť	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prevzatie staveniska, vytyčenie, zariadenie staveniska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Výroba a dodávka hracích a fitnes prvkov (lehota dodania)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zemné práce	7 629	7 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakladanie (betónové pätky, geotextília)	-	-	1 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oplotenie – osadenie stĺpikov	-	-	3 765	3 765	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrubníky, odvodňovacie žľaby, stupne	-	-	-	4 400	4 400	-	-	-	-	-	-	-
Podklady a spevnené plochy – chodník, dlažby	-	-	-	-	5 304	5 304	5 304	-	-	-	-	-
Drenážna betónová dlažba – dopadové plochy	-	-	-	-	-	-	5 102	5 102	-	-	-	-
Oplotenie – montáž panelov a brán	-	-	-	-	-	5 162	5 162	-	-	-	-	-
Presun hmôt SO 02	-	-	-	-	-	-	-	2 469	-	-	-	-
Montáž a osadenie hracích a fitnes prvkov	-	-	-	-	-	-	-	-	34 440	34 440	-	-
Terénne a sadové úpravy, výsadba, trávnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 424	5 424	-
Osadenie plastových obrubníkov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441	-	-
Presun hmôt SO 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 436	-
Dopravné náklady (VRN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-
Dokončovacie práce, čistenie, odovzdanie diela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Náklady v týždni	7 628,68 €	7 628,68 €	5 679,30 €	8 165,33 €	9 704,41 €	10 465,54 €	15 567,14 €	7 570,25 €	34 440,00 €	40 304,80 €	9 359,77 €	-
Kumulatívne čerpanie	7 628,68 €	15 257,36 €	20 936,66 €	29 101,99 €	38 806,40 €	49 271,94 €	64 839,08 €	72 409,33 €	106 849,33 €	147 154,13 €	156 513,90 €	156 513,90 €

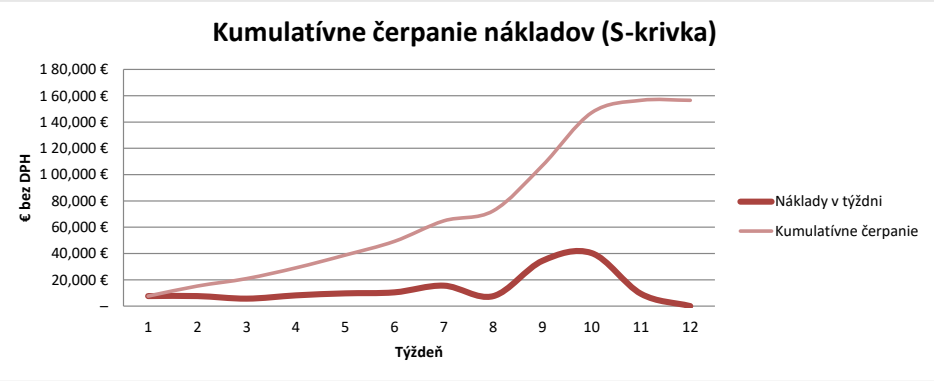

VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE

Vybudovanie športovo oddychovej zóny v obci Skároš

Celkové trvanie: 12 týždňov • Reálne realizovateľné tempo so štandardnými dodacími lehotami a primeranou rezervou

Objednávateľ: Obec Skároš • Zhotoviteľ: PLAYSYSTEM s.r.o., Košice • Projektant: Ing. Radoslav Cigan, ProCer Košice, s.r.o.

P.č.	Činnosť / etapa	Objekt	Náklady [€ bez DPH]	Začiatok (týž.)	Trvanie (týž.)	Mesiac 1				Mesiac 2				Mesiac 3			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Prevzatie staveniska, vytýčenie, zariadenie staveniska	Príprava	v réžii / v cene	1	1												
2	Výroba a dodávka hracích a fitnes prvkov (lehota dodania)	SO 01	v réžii / v cene	1	7												
3	Zemné práce	SO 02	15 257,36 €	1	2												
4	Zakladanie (betónové pätky, geotextília)	SO 02	1 914,41 €	3	1												
5	Oplotenie – osadenie stĺpikov	SO 02	7 529,78 €	3	2												
6	Obrubníky, odvodňovacie žľaby, stupne	SO 02	8 800,88 €	4	2												
7	Podklady a spevnené plochy – chodník, dlažby	SO 02	15 911,92 €	5	3												
8	Drenážna betónová dlažba – dopadové plochy	SO 02	10 203,20 €	7	2												
9	Oplotenie – montáž panelov a brán	SO 02	10 323,13 €	6	2												
10	Presun hmôt SO 02	SO 02	2 468,65 €	8	1												
11	Montáž a osadenie hracích a fitnes prvkov	SO 01	68 880,00 €	9	2												
12	Terénne a sadové úpravy, výsadba, trávnik	SO 03	10 847,62 €	10	2												
13	Osadenie plastových obrubníkov	SO 03	440,99 €	10	1												
14	Presun hmôt SO 03	SO 03	3 435,96 €	11	1												
15	Dopravné náklady (VRN)	SO 03	500,00 €	11	1												
16	Dokončovacie práce, čistenie, odovzdanie diela	Záver	v réžii / v cene	12	1												
SPOLU – náklady bez DPH			156 513,90 €														
DPH 23 %			35 998,20 €														
Náklady s DPH			192 512,10 €														

Legenda:

Prípravné práce Dodávka prvkov (le SO 02 – cho SO 01 – hra SO 03 – sad Dokončenie / odovzdanie
